

# INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Vigencia 2019

Localidad de  
Usme

Secretaría Distrital de Planeación

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local

# CONTENIDO

1.	MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL	1
2.	INTRODUCCIÓN	2
3.	BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PDL	4
3.1	EJECUCIÓN POR METAS	10
4.	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	15
5.	PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PDL	19
5.1	TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN	29
6.	DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS	37
7.	ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2019	39

## 1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL

Primero que todo quisiera agradecer a todas las personas que habitan y pernoctan en la localidad quinta de Usme por acompañarnos y por brindarnos todo el apoyo necesario para salir adelante en los retos que diariamente resolvimos en nuestro querido sector durante la anterior vigencia.

Desde que tomé posesión como Alcalde Local, en conjunto con la administración emprendimos este recorrido y hemos trabajado incansablemente de la mano con los habitantes y líderes de la localidad, llevando el mayor bienestar y servicio a los ciudadanos de las distintas poblaciones y comunidades que conforman la localidad, ligados a las juntas de acción local, comerciantes, empresarios, gente del campo, niños, niñas, adolescentes, mujeres, comunidades afros e indígenas, adulto mayor, grupos LGBTI, personas con discapacidad y todos aquellos grupos y representaciones de expresiones sociales que nos acompañan para avanzar como ciudad.

Miramos en retrospectiva los avances en las problemáticas que hemos solucionado como administración local y distrital junto a la Alcaldía Mayor de Bogotá, y encontraremos en este documento los logros alcanzados en la vigencia 2019, en los cuales debemos resaltar que gracias a la participación activa de todos ustedes y al trabajo de los funcionarios y contratistas de todas las dependencias de la Alcaldía Local de Usme; hoy podemos decir que hemos cumplido ampliamente en nuestros aportes a lograr una mejor localidad, con mejores oportunidades para todos.

Por último, les hago la invitación a todos ustedes para que sigamos trabajando y seamos ciudadanos de bien, para sentirnos orgullosos y amorosos de nuestra localidad y ser ejemplo y estandarte en temas de emprendimiento, ambientales, sociales, culturales y sostenibles en el tiempo. No se olviden que el apoyo suyo es vital para seguir con los procesos de transformación educativa y económica, por ello, estamos trabajando incansablemente para no desfallecer en estas premisas.

De ustedes muy agradecido.

**JORGE ELICER PEÑA PINILLA**  
Alcalde Local de Usme



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## 2. INTRODUCCIÓN

Esta Administración Local se ha destacado por garantizar la convivencia pacífica y el cumplimiento de la ley, protegiendo los derechos y promoviendo los deberes de los ciudadanos, razón por la cual se han adelantado sensibilizaciones a la comunidad urbana y de la ruralidad, a comerciantes, a estudiantes y se han hecho recorridos en cabeza del Alcalde Local con acompañamiento de diferentes sectores distritales promoviendo una ciudadanía activa y responsable.

Contamos con un excelente equipo de trabajo, a través del cual nos articulamos de forma eficiente y efectiva con las autoridades distritales, locales, juntas de acción comunal y en general con la comunidad usmeña en los diferentes espacios de participación, como lo son: Las mesas territoriales, los consejos locales; de gobierno, de seguridad, de sabios y sabias, de discapacidad, entre otros, vinculando a personas a ejercicios de convivencia ciudadana. Esto para mejorar la calidad de vida de la población residente y flotante de nuestra localidad, manteniendo la entrega del apoyo económico para personas mayores (Subsidio Tipo C), y atendiendo problemáticas de salud con el suministro de ayudas técnicas no cubiertas por el POS a personas en condición de discapacidad, así como la entrega de dotaciones pedagógicas a instituciones educativas (Jardines y Colegios) en aras de tener mayor inclusión educativa con equidad.

También, se han implementado acciones efectivas de estudios preliminares para la regularización urbanística y acompañamiento en demandas de titulación predial para la incorporación de vida urbana y control de ilegalidad, ejerciendo Inspección, vigilancia y control en todo el territorio local. A su vez, se ha venido aunando esfuerzos efectuando las acciones pertinentes para proteger y adaptar a las familias en estado de vulnerabilidad en aras de mitigar los riesgos que se presentan por el cambio climático. Por otra parte, se ha realizado la siembra de árboles nativos en la localidad y se ha brindado asesoría y acompañamiento técnico en temas agropecuarios para la ruralidad.

En tema de seguridad, se invirtió en la compra de motocicletas y vehículos para la policía local y en la instalación de cámaras de seguridad debidamente conectadas con el centro de monitoreo y vigilancia de la policía metropolitana de Bogotá.

Por su parte, en infraestructura, se comprometió la mayor cantidad del presupuesto de la vigencia contratando la construcción y mantenimiento de vías urbanas, rurales, la adecuación y mantenimiento del espacio público urbano, en pro del mejoramiento de la movilidad de todos y todas, así mismo, se comprometieron recursos para la construcción de obras de mitigación, construcción y conservación de parques y la adecuación de salones comunales.

Por tal razón, somos una administración transparente y líder en varios procesos de gestión administrativa y operacional en el Distrito Capital, ya que aplicamos el modelo de buen gobierno en



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



cumplimiento de los estándares de la Secretaría de Gobierno, obteniendo unos excelentes resultados de gestión, así como articulando el esquema institucional de participación social para la formulación, implementación, evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción y prevención de los Derechos Humanos y al respeto a la dignidad de las personas. Así, asegurándonos de garantizar el acceso de la ciudadanía a la información, con publicaciones de interés general en nuestra página web y en las redes sociales, lo cual es una muestra de una administración efectiva y confiable para la ciudadanía.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.


### 3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PDL

#### AVANCE PONDERADO PLAN DE DESARROLLO LOCAL

El avance del Plan de Desarrollo Local -PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución de cada meta, programa, eje o pilar de acuerdo a la metodología de ponderación establecida por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Se entiende que el avance acumulado se calcula con base en el periodo de vigencia del plan, es decir, cuatro años (2017-2020), por lo que para el cierre de la vigencia 2019 el avance esperado corresponde al 75%. Este porcentaje, aplica para los cálculos relacionados con el avance del plan, pilar y eje, programa, sector y proyecto de inversión.

Dado lo anterior y como se muestra en la gráfica No. 1 la localidad de Usme a 31 de diciembre de 2019 presentó un avance acumulado contratado del PDL del 61.6%. Por su parte, en cuanto a los bienes y servicios entregados a esa fecha, el plan presentó un avance del 49.6%, lo que indica que el 80,4% de lo contratado fue entregado.

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020.

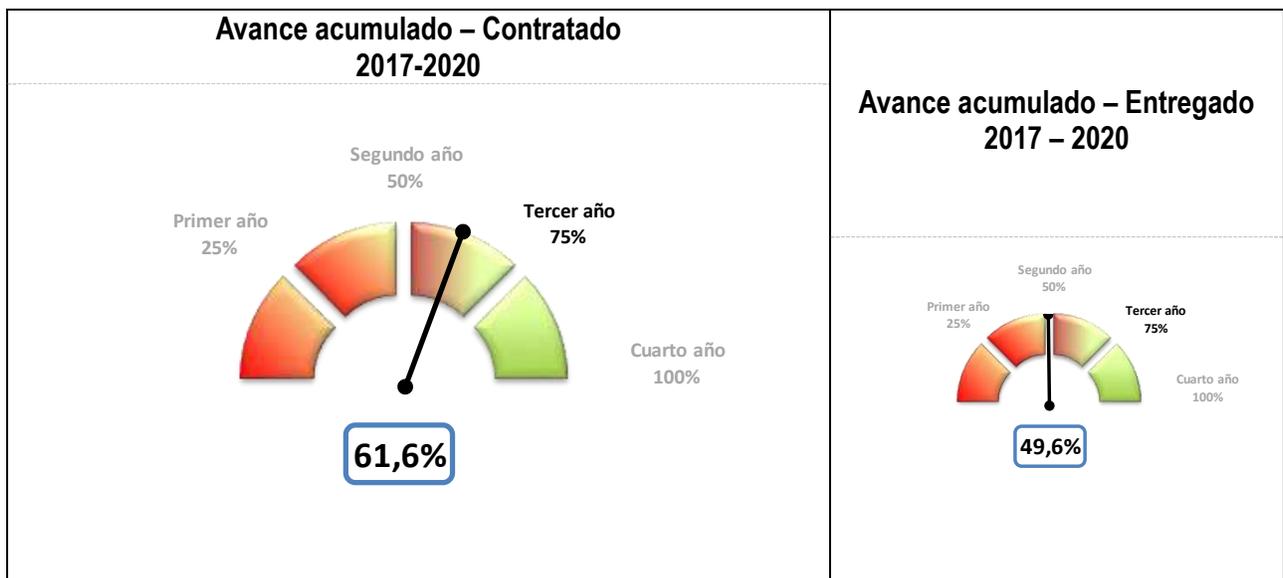


Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Frente a la ejecución anual del PDL, el avance según lo contratado tuvo su mayor crecimiento porcentual en la vigencia 2018 con un 23,4% de incremento y el mayor avance conforme a los bienes y servicios entregados se presenta en la vigencia 2019 con un incremento del 31,4%.


**Gráfica No. 2. Evolución del porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020.**

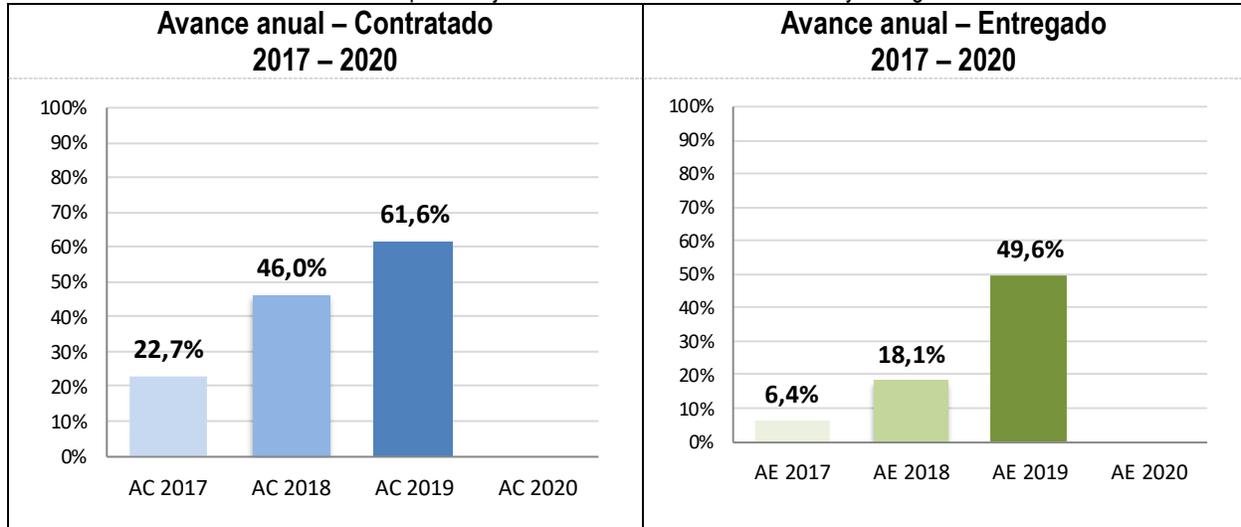

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

A corte del 31 de diciembre de 2019 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado contratado de su PDL igual a 79,9%. Con respecto a las otras localidades, la localidad de Usme ocupa el décimo octavo lugar de avance contratado de su PDL. Para el caso del avance entregado, el promedio se sitúa en 58,8% dadas las dificultades tanto en los tiempos de ejecución como en el rezago presupuestal. En este aspecto, la localidad ocupa el puesto décimo sexto.

**Gráfica No. 3. Ranking de avance PDL por localidad.**

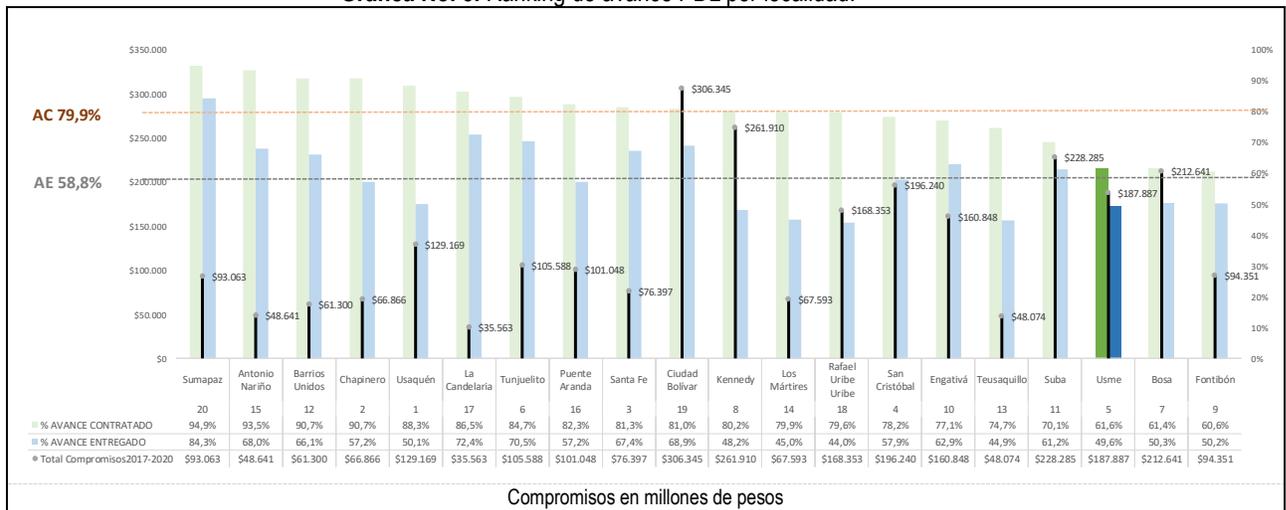

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

## AVANCE POR PILAR Y EJES DEL PLAN

En lo que respecta al avance por pilar y ejes del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance acumulado contratado lo presentó el eje Construcción de comunidad (82.5%), que incluye los temas relacionados con Seguridad y convivencia. En segundo lugar, está el pilar Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética (82.4%) que incluye los temas relacionados con Restauración ecológica, cobertura verde en el espacio público urbano, arbolado y jardinería. Y en tercer lugar, el eje transversal Igualdad de calidad de vida (79.3%) que incluye los temas relacionados con atención integral de niño, niñas y personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica, cultura, la recreación y el deporte. El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al pilar Construcción de comunidad (82.5%),

Gráfica No. 4. Avance por pilar o eje.

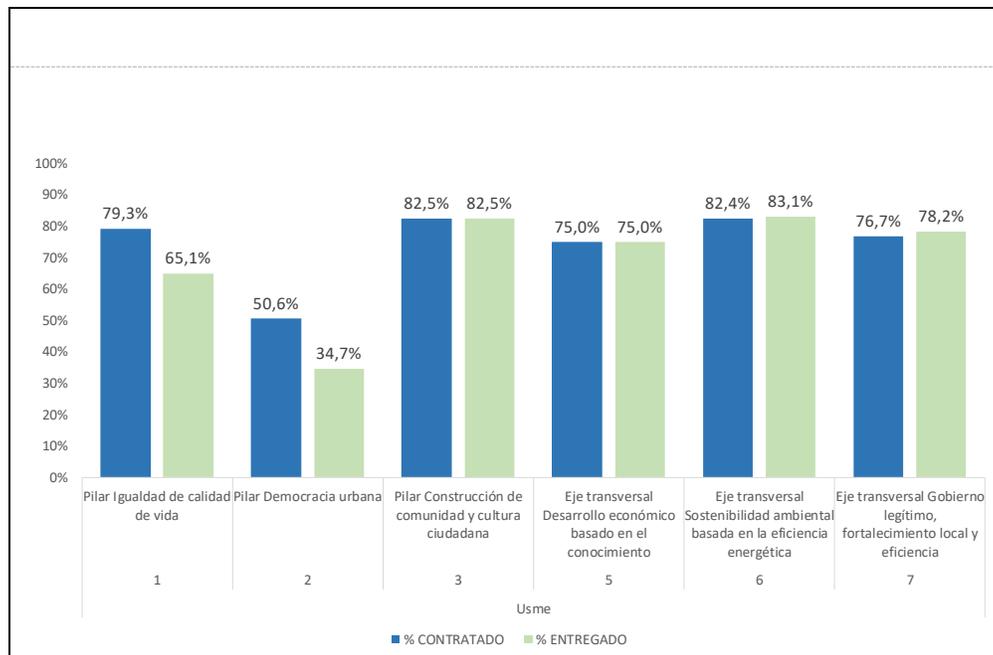

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## AVANCE POR PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO

Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Usme cuenta con 13 programas. De los cuales sobresalen en el avance contratado, Inclusión educativa para la equidad con 100%, Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad (98%) y Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia (96,7%). El programa que mayores recursos comprometió en la vigencia 2019 fue Mejor movilidad para todos con \$29.228 millones.

Gráfica No. 5. Avance programas.

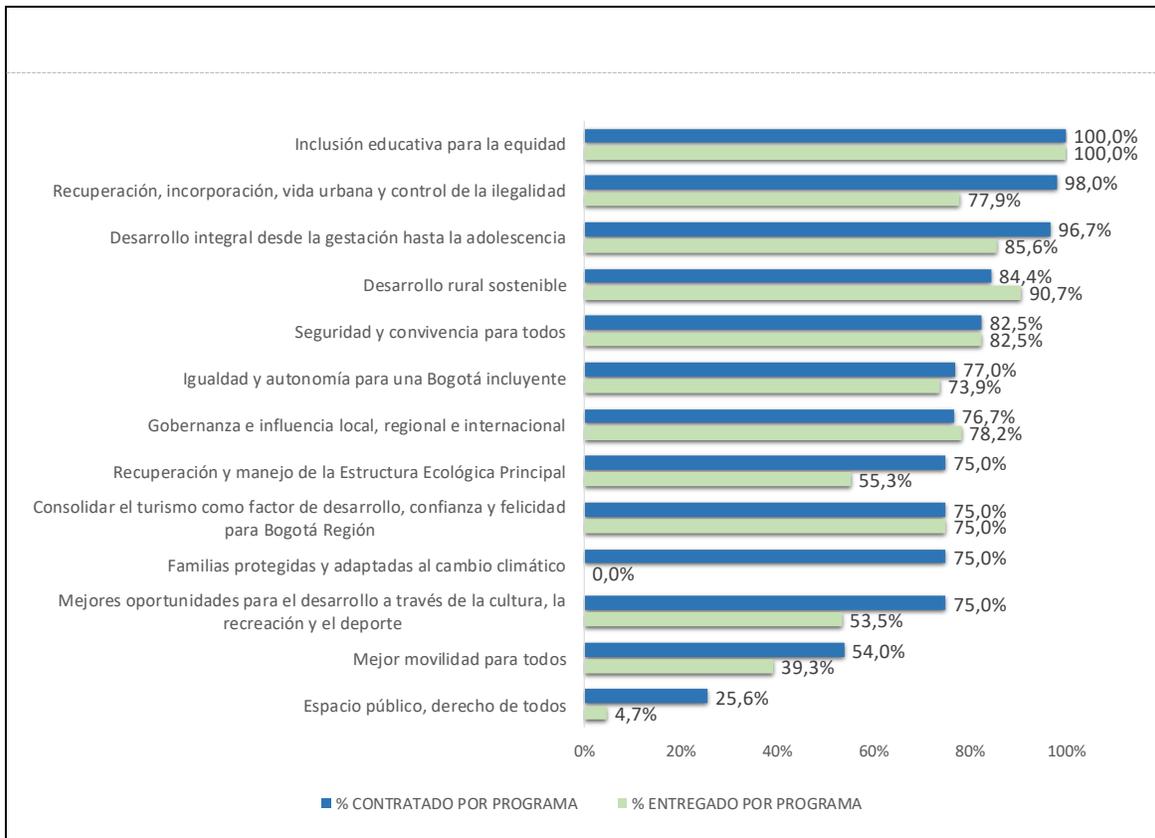

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## EJECUCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL

Para avanzar en el cumplimiento de las metas del PDL de Usme, la Alcaldía Local ha ejecutado recursos en 15 proyectos de inversión. A continuación, se presenta el avance acumulado contratado de cada uno de ellos, con el presupuesto comprometido por vigencia.

**Tabla No. 1.** Avance por proyecto de inversión.

Código Proyecto	Nombre Proyecto	AVANCE CONTRATADO	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Total Compromisos 2017 2020
3-3-1-15-01-02-1402-00	Todos comprometidos con nuestros niños y niñas	↑ 96,7%	\$1.144	\$1.318	\$1.271	\$3.732
3-3-1-15-01-03-1403-00	Apoyo económico para un envejecimiento digno e incluyente	↑ 75,0%	\$5.031	\$4.882	\$5.050	\$14.964
3-3-1-15-01-03-1404-00	Apoyo oportuno a personas en situación de discapacidad	↑ 100,0%	\$35	\$1.115	\$683	\$1.833
3-3-1-15-01-04-1405-00	Usme consciente de su territorio y riesgos	↑ 75,0%	\$905	\$30		\$935
3-3-1-15-01-07-1406-00	Dotaciones pedagógicas para el desarrollo integral	↑ 100,0%	\$487	\$558	\$535	\$1.580
3-3-1-15-01-11-1407-00	Desarrollo integral promoción y apoyo de la cultura y el deporte	↑ 75,0%	\$2.097	\$2.463	\$2.504	\$7.064
3-3-1-15-02-15-1409-00	Organización para el desarrollo del territorio local	↑ 98,0%	\$913	\$1.099	\$850	\$2.863
3-3-1-15-02-17-1408-00	Infraestructura para la recreación y la convivencia	↓ 25,6%	\$5.434	\$6.449	\$9.027	\$20.910
3-3-1-15-02-18-1410-00	Desarrollo de la movilidad local	→ 54,0%	\$27.094	\$33.177	\$29.228	\$89.499
3-3-1-15-03-19-1411-00	Seguridad, compromiso de todos	↑ 82,5%	\$2.786	\$1.788	\$2.026	\$6.601
3-3-1-15-05-37-1413-00	Usme ecoturística	↑ 75,0%	\$393	\$452	\$435	\$1.280
3-3-1-15-06-38-1412-00	Apoyo al ambiente local	↑ 75,0%	\$193	\$222	\$212	\$627
3-3-1-15-06-41-1414-00	Promoción del emprendimiento rural	↑ 84,4%	\$550	\$769	\$756	\$2.075
3-3-1-15-07-45-1415-00	Gobernanza y gobernabilidad local en el distrito y la región	↑ 77,9%	\$6.769	\$14.473	\$9.746	\$30.988
3-3-1-15-07-45-1416-00	Participación, control y pertenencia local	→ 67,0%	\$1.002	\$932	\$1.002	\$2.936

Cifras en millones pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## NIVEL DE AVANCE POR METAS

En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2019 el avance esperado corresponde al 75%. Dado que es una medición acumulada (2017-2020), según los tres niveles de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo, el nivel alto significa que tiene avance acumulado igual o superior al 70%, medio cuando su nivel de avance es mayor del 30% y menor del 70%, y el nivel bajo cuando el avance de la meta es menor o igual al 30%.

Para la localidad de Usme, existe un total de 35 metas en el PDL. Del total de metas, 3 presentan un nivel de avance contratado bajo, 4 un nivel medio y 28 un nivel alto. En este sentido, el 88.6% de las metas presentan un avance contratado entre el nivel medio y alto.

**Gráfica No. 6.** Nivel de avance de metas según lo contratado.

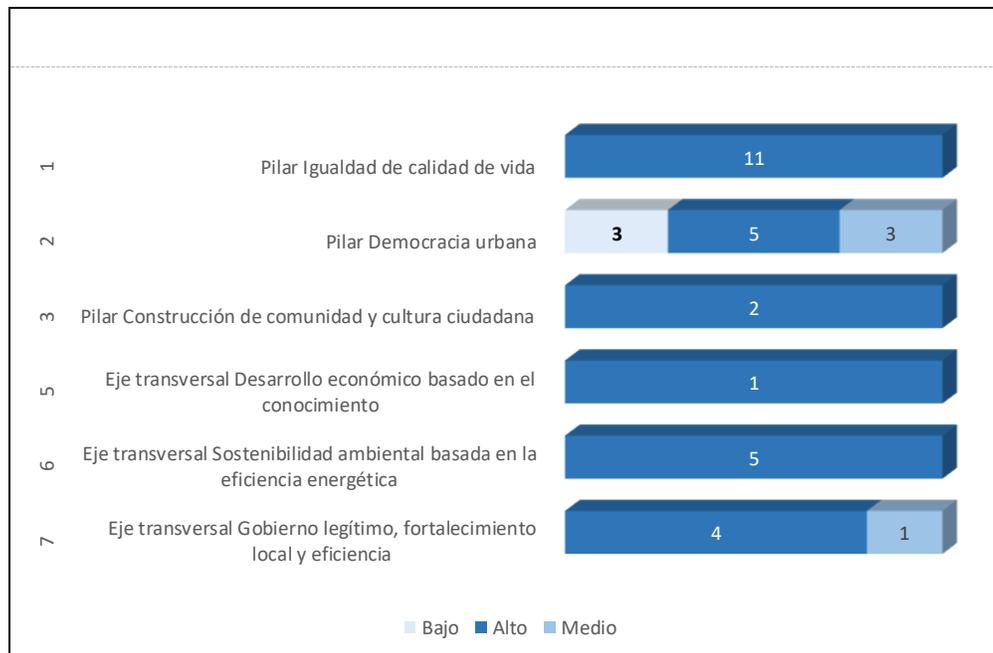

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## 3.1 EJECUCIÓN POR METAS

### EJECUCIÓN DE METAS SEGÚN LOS PROGRAMADO VIGENCIA 2019

Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2019, teniendo en cuenta lo programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia y el avance contratado de las metas en cada pilar o eje. Para el caso de la localidad de Usme, en 2019 se programaron 34 metas, de las cuales, 30 (88.2%) presentaron avance en la contratación. A continuación, se presentan las metas programadas para la vigencia 2019.

#### Pilar 1. Igualdad de calidad de vida.

**Tabla No. 2.** Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Igualdad de calidad de vida.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Adecuar 4 jardines infantiles	1,0	1,0	100,0%
Dotar 137 jardines infantiles para la primera infancia en la localidad	47,0	54,0	114,9%
Vincular 800 personas en procesos de protección, prevención de maltrato y de todas las formas de trabajo infantil	200,0	200,0	100,0%
Entregar 3107 subsidios tipo c a personas mayores por anualidad	3.107,0	3.107,0	100,0%
Beneficiar 800 personas de la localidad en condición de discapacidad con ayudas técnicas NO cubiertas por el POS	200,0	210,0	105,0%
Construir 4 obras de mitigación para puntos críticos que presenten afectación por problemas de inundación, deslizamiento y remoción en masa	1,0	-	-
Dotar 10 IED de la localidad en con dotaciones pedagógicas de conformidad con sus necesidades	3,0	15,0	500,0%
Apoyar 68 eventos artísticos y culturales	17,0	17,0	100,0%
Realizar 40 eventos de recreación y deporte	10,0	10,0	100,0%
Vincular 2400 personas a procesos de formación artística y cultural	600,0	1.200,0	200,0%
Vincular 2400 personas a procesos de formación, deportiva, recreativa y de actividad física	600,0	1.200,0	200,0%



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## Pilar 2. Democracia urbana.

**Tabla No. 3.** Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Democracia urbana.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Apoyar 650 demandas de titulación predial por medio de acompañamiento	162,0	300,0	185,2%
Realizar 8 estudios preliminares para la regularización urbanística (levantamiento topográficos y análisis de los mismos) a asentamientos de origen informal previamente legalizados y	2,0	-	-
Construir 10 parques vecinales y/o de bolsillo	30,0	1,0	3,3%
Intervenir 120 parques vecinales y/o de bolsillo	30,0	12,0	40,0%
Construir 8 Km/carril de malla vial local rural	2,0	13,2	662,0%
Construir 12 Km/carril de malla vial local urbana de usme	3,0	1,9	62,7%
Mantener 84 Km/carril de malla vial local de usme	21,0	8,3	39,5%
Mantener 80 Km/carril de malla vial rural	20,0	16,2	81,0%
Construir 24000 m2 de espacio público	6.000,0	1.971,4	32,9%
Mantener 211882 m2 de espacio público	52.971,0	3.035,3	5,7%
Construir 4 puentes peatonales de escala local sobre cuerpos de agua intervenidos	1,0	-	-

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

### Pilar 3. Construcción de comunidad.

Tabla No. 4. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Construcción de comunidad.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Realizar 4 dotaciones de seguridad	1,0	1,0	100,0%
Vincular 3000 personas a ejercicios de convivencia ciudadana	750,0	-	-

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

### Eje transversal. Desarrollo económico basado en el conocimiento

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Vincular 2400 personas en el proyecto estratégico ecoturístico de conservación ambiental	600,0	600,0	100,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

### Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética.

Tabla No. 5. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Eje Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Sembrar 4000 árboles nativos en la localidad	1.000,0	1.000,0	100,0%
Intervenir 4 Hectáreas de espacio público con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo	1,0	1,0	100,0%
Intervenir 400 mts2 de espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	100,0	100,0	100,0%
Beneficiar 540 personas a través de emprendimientos rurales	135,0	135,0	100,0%
Beneficiar 24480 personas con acciones de asesoría técnica agropecuaria y/o asistencia en tecnologías ambientales sostenibles	6.586,0	3.294,0	50,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.**

**Tabla No. 6.** Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Eje Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Realizar 1 estrategia de fortalecimiento institucional	1,0	1,0	100,0%
Implementar 1 estrategia de IVC que permita mejorar los índices de eficiencia y eficacia de la Alcaldía	1,0	1,0	100,0%
Fortalecer 100 Organizaciones organizaciones, instancias y expresiones sociales	20,0	20,0	100,0%
Vincular 3200 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social	800,0	1.400,0	175,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

**EJECUCIÓN DE METAS ACUMULADA 2017-2020**

La siguiente tabla presenta el detalle de indicadores de las Líneas de Inversión Local teniendo en cuenta su avance contratado y entregado acumulado.

**Tabla No. 7.** Avance acumulado por Líneas de Inversión Local e indicador.



**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

Cód	Línea de Inversión	Nombre Indicador	Tipo de actualización	Magnitud Programada 2017-2020	Magnitud Contratada 2017-2020	Magnitud Entregada 2017-2020	% Avance Acumulado contratado 2017-2020	% Avance Acumulado Entregado 2017-2020
1	Malla vial, espacio público y peatonal	Km/carril de malla vial rural construidos	Suma	8	19	11	240,5%	135,5%
		Km/carril de malla vial local construido	Suma	12	9	7	74,3%	58,8%
		Km/carril de malla vial local mantenido	Suma	84	41	34	49,2%	40,0%
		Km/carril de malla vial rural mantenidos	Suma	80	56	34	69,6%	42,2%
		m2 de espacio público construidos	Suma	24.000	18.824	6.000	78,4%	25,0%
		m2 de espacio público mantenidos	Suma	211.882	3.038	-	1,4%	-
		Puentes vehiculares y/o peatonales, de escala local sobre cuerpos de agua	Suma	4	1	-	25,0%	-
2	Parques	Parques vecinales y/o de bolsillo construidos	Suma	10	2	-	20,0%	-
		Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos	Suma	120	42	15	35,0%	12,5%
3	Seguridad y convivencia	Dotaciones para seguridad realizadas	Suma	4	3	3	75,0%	75,0%
		Personas vinculadas a ejercicios de convivencia ciudadana	Suma	3.000	3.800	3.800	126,7%	126,7%
4	Inspección, vigilancia y control - IVC	Acciones de inspección, vigilancia y control realizadas	Constante	1	1	1	75,0%	75,0%
		Demandas de titulación predial presentadas	Suma	650	624	356	96,0%	54,8%
		Estudios preliminares para la regularización urbanística	Suma	8	8	10	100,0%	125,0%
5	Atención a población	Personas con subsidio tipo C beneficiadas	Constante	3.107	2.330	2.324	75,0%	74,8%
6	Gestión pública local	Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas	Constante	1	1	1	75,0%	75,0%
7	Atención a población vulnerable	Personas beneficiadas con ayudas técnicas no POS	Suma	800	810	507	101,3%	63,4%
		Personas vinculadas a acciones de promoción del buen trato infantil	Suma	800	800	800	100,0%	100,0%
8	Dotación	IED dotados con material pedagógico	Suma	10	33	30	330,0%	300,0%
		Jardines infantiles adecuados	Suma	4	3	2	75,0%	50,0%
		Jardines infantiles dotados	Suma	137	154	120	112,4%	87,6%
9	Obras prioritarias de mitigación o	Jardines infantiles dotados	Suma	4	3	-	75,0%	-
10	Procesos de formación artística, cultural y deportiva	Personas vinculadas a procesos de formación artística y cultural	Suma	2.400	1.800	1.200	75,0%	50,0%
		Personas vinculadas a procesos de formación deportiva	Suma	2.400	1.800	1.200	75,0%	50,0%
11	Eventos artísticos, culturales y deportivos	Eventos artísticos y culturales realizados	Suma	68	51	38	75,0%	55,9%
		Eventos de recreación y deporte realizados	Suma	40	30	21	75,0%	52,5%
12	Protección y recuperación de los recursos ambientales	Arboles sembrados o intervenidos	Suma	4.000	3.000	2.000	75,0%	50,0%
		Hectáreas de espacio público intervenidas con acciones de	Suma	4	3	2	75,0%	50,0%
		m2 de espacio público intervenidos con acciones de jardinería, muros	Suma	400	300	1.100	75,0%	275,0%
		Personas beneficiadas a través de emprendimientos rurales	Suma	540	405	270	75,0%	50,0%
		Personas beneficiadas con acciones de asesoría técnica agropecuaria y/o	Suma	24.480	21.188	35.725	86,6%	145,9%
13	Participación	Organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas	Suma	100	65	80	65,0%	80,0%
		Personas vinculadas a procesos de participación ciudadana y/o control	Suma	3.200	2.860	2.860	89,4%	89,4%
15	Proyecto estratégico	Personas vinculadas en el proyecto estratégico ecoturístico de	Suma	2.400	1.800	1.800	75,0%	75,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.


## 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de las vigencias 2017, 2018 y 2019 se fundamentó en la información reportada por el sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS) de la Secretaría Distrital de Hacienda.

La Alcaldía Local de Usme ha comprometido un presupuesto acumulado de \$187.887 millones en las vigencias 2017, 2018 y 2019, de los cuales la mayor proporción se comprometió en la vigencia 2018 con un valor de \$69.727 millones (99%). Así mismo la mayor proporción de giros dentro de la misma vigencia se realizó en el año 2019, los cuales fueron por valor de \$13.878 millones (21.1%).

Es importante aclarar que los giros presentados fueron realizados dentro de la misma vigencia en la cual se comprometieron, teniendo en cuenta que una vez pasan la vigencia en la cual fueron comprometidos se constituyen presupuestalmente en obligaciones por pagar.

**Gráfica No. 7.** Porcentaje de ejecución presupuestal por vigencia del PDL

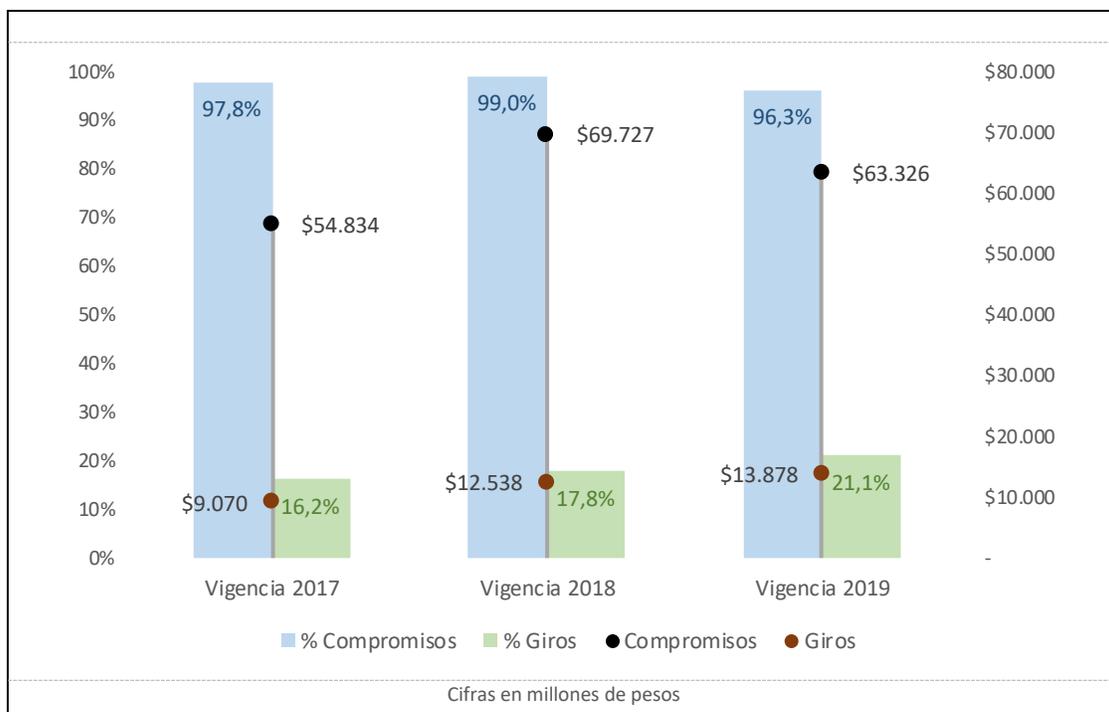

Fuente: PREDIS vigencias 2017, 2018 y 2019



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR

El análisis de la ejecución presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de recursos comprometidos en la vigencias 2017, 2018 y 2019 son Movilidad \$89.499 millones que representa el 47.6% del total del presupuesto de inversión, Gobierno con \$33.924 millones (18.1%) y Cultura, recreación y deporte \$27.975 millones (14.9%).

**Tabla No. 8.** Ejecución Presupuestal por sector. Diciembre 2019.

SECTOR	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Total. Compromisos 2017-2020	% Compromisos 2017-2020
Sector Movilidad	\$27.094	\$33.177	\$29.228	\$89.499	47,6%
Sector Gobierno	\$7.771	\$15.405	\$10.748	\$33.924	18,1%
Sector Cultura, recreación y deporte	\$7.531	\$8.912	\$11.532	\$27.975	14,9%
Sector Integración social	\$6.175	\$6.200	\$6.321	\$18.696	10,0%
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	\$2.786	\$1.788	\$2.026	\$6.601	3,5%
Sector Ambiente	\$1.648	\$1.020	\$968	\$3.637	1,9%
Sector Hábitat	\$913	\$1.099	\$850	\$2.863	1,5%
Sector Salud	\$35	\$1.115	\$683	\$1.833	1,0%
Sector Educación	\$487	\$558	\$535	\$1.580	0,8%
Sector Desarrollo económico, industria y turismo	\$393	\$452	\$435	\$1.280	0,7%
<b>TOTALES</b>	<b>\$54.834</b>	<b>\$69.727</b>	<b>\$63.326</b>	<b>\$187.887</b>	<b>100,0%</b>

Cifras en millones de pesos

Fuente: PREDIS vigencia 2019

## EJECUCIÓN POR LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL

Este ítem realiza un análisis con base en las líneas de inversión local. Estas líneas son un instrumento que, dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen el marco de referencia con el cual la administración distrital determina una orientación estratégica de las inversiones que se podrán adelantar en el horizonte del plan. Por tanto, las líneas delimitan el marco de actuación presupuestal de las alcaldías locales y describen las finalidades de objetos de gasto de inversión autorizadas a los FDL y, por ende, se convierten en el insumo clave para los gobiernos locales en los cuatro años de mandato.

A continuación se presenta el porcentaje de presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de Inversión Local en cada vigencia del PDL:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**Tabla No. 9.** Porcentaje de presupuesto comprometido por Líneas de Inversión Local.

Anexos Línea de inversión	% POAI 2017	% Compromisos 2017	% POAI 2018	% Compromisos 2018	% POAI 2019	% Compromisos 2019
<b>Anexo 1 (85%)</b>	<b>87,0%</b>	<b>87,6%</b>	<b>87,0%</b>	<b>88,7%</b>	<b>87,0%</b>	<b>88,3%</b>
Atención a población vulnerable_Subsidio C	9,0%	9,2%	9,0%	7,0%	9,0%	8,0%
Gestión pública local	10,0%	10,1%	10,0%	18,6%	10,0%	12,7%
Inspección, vigilancia y control - IVC	4,0%	4,0%	4,0%	3,7%	4,0%	4,0%
Malla vial, espacio público y peatonal	49,0%	49,4%	49,0%	47,6%	49,0%	46,2%
Parques	10,0%	9,9%	10,0%	9,2%	10,0%	14,3%
Seguridad y convivencia	5,0%	5,1%	5,0%	2,6%	5,0%	3,2%
<b>Anexo 2 (15%)</b>	<b>13,0%</b>	<b>12,4%</b>	<b>13,0%</b>	<b>11,3%</b>	<b>13,0%</b>	<b>11,7%</b>
Atención a población vulnerable	1,2%	0,4%	1,2%	1,9%	1,2%	1,6%
Dotación	2,6%	2,6%	2,6%	2,3%	2,6%	2,3%
Eventos artísticos, culturales y deportivos	3,0%	2,1%	3,0%	3,5%	3,0%	2,9%
Obras prioritarias de mitigación o prevención de riesgo	1,6%	1,6%	1,6%	0,0%	1,6%	-
Participación	1,5%	1,8%	1,5%	1,3%	1,5%	1,6%
Procesos de formación artística, cultural y deportiva	0,9%	1,7%	0,9%	-	0,9%	1,0%
Protección y recuperación de los recursos ambientales	1,6%	1,4%	1,6%	1,4%	1,6%	1,5%
Proyecto estratégico	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,7%	0,7%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

Es importante tener presente que la Directiva 005 de 2016 estableció los lineamientos de política para las líneas de inversión local en la formulación de los Planes Locales de Desarrollo 2017-2020, señaló que el 85% de la inversión se realizaría en temas estratégicos distribuidos en 50% en Malla vial, espacio público y peatonal; 10% Parques y 10% Gestión Pública Local; 6% Atención a población vulnerable; 5% Seguridad y Convivencia, 4% Inspección, vigilancia y control – IVC.

En los temas estratégicos del Plan de Desarrollo Local de Usme, los mayores recursos comprometidos del PDL en las líneas de inversión priorizadas durante el periodo 2017, 2018 y 2019 fueron: “Malla vial, espacio público y peatonal” con un monto de \$89.499 millones, “Gestión pública local” con \$26.555 millones y “Parques” con \$20.910 millones.

Dentro de las otras inversiones del plan (15%), las líneas de inversión que han comprometido más recursos durante el periodo del PDL son: “Eventos artísticos culturales y deportivos” con un monto de \$5.466 millones “Dotación” con \$4.556 millones, y “Participación” con \$2.936 millones.

A continuación, se presenta el presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de Inversión Local en cada vigencia del PDL:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**Tabla No. 10.** Presupuesto comprometido por Líneas de Inversión Local.

Anexos Línea de inversión	POAI 2017	Compromisos 2017	POAI 2018	Compromisos 2018	POAI 2019	Compromisos 2019	Total Compromisos 2017_2020
<b>Anexo 1 (85%)</b>	<b>\$48.587</b>	<b>\$48.027</b>	<b>\$55.753</b>	<b>\$61.869</b>	<b>\$53.318</b>	<b>\$55.929</b>	<b>\$165.825</b>
Atención a población vulnerable_Subsidio C	\$5.031	\$5.031	\$5.773	\$4.882	\$5.521	\$5.050	\$14.964
Gestión pública local	\$5.584	\$5.515	\$6.408	\$12.967	\$6.128	\$8.073	\$26.555
Inspección, vigilancia y control - IVC	\$2.234	\$2.167	\$2.563	\$2.605	\$2.451	\$2.524	\$7.296
Malla vial, espacio público y peatonal	\$27.362	\$27.094	\$31.398	\$33.177	\$30.026	\$29.228	\$89.499
Parques	\$5.584	\$5.434	\$6.408	\$6.449	\$6.128	\$9.027	\$20.910
Seguridad y convivencia	\$2.792	\$2.786	\$3.204	\$1.788	\$3.064	\$2.026	\$6.601
<b>Anexo 2 (15%)</b>	<b>\$7.254</b>	<b>\$6.807</b>	<b>\$8.324</b>	<b>\$7.858</b>	<b>\$7.960</b>	<b>\$7.397</b>	<b>\$22.062</b>
Atención a población vulnerable	\$656	\$217	\$753	\$1.356	\$720	\$1.017	\$2.589
Dotación	\$1.429	\$1.450	\$1.639	\$1.635	\$1.568	\$1.472	\$4.556
Eventos artísticos, culturales y deportivos	\$1.678	\$1.160	\$1.926	\$2.463	\$1.841	\$1.844	\$5.466
Obras prioritarias de mitigación o prevención de Participación	\$877	\$905	\$1.007	\$30	\$963		\$935
Procesos de formación artística, cultural y depor	\$813	\$1.002	\$933	\$932	\$892	\$1.002	\$2.936
Protección y recuperación de los recursos ambie	\$509	\$938	\$584	\$991	\$558	\$660	\$1.598
Proyecto estratégico	\$894	\$743	\$1.026	\$991	\$981	\$968	\$2.702
	\$398	\$393	\$457	\$452	\$437	\$435	\$1.280

Cifras en millones de pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## 5. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PDL

### Comportamiento de la inversión de la vigencia 2019.

En el marco de la inversión la alcaldía local de Usme presenta a continuación el análisis de los recursos comprometidos respecto del presupuesto de inversión en relación con los 15 proyectos de inversión. Como disponibilidad en el 2019 se cuenta con \$65.763.979.485 de los cuales al cerrar la vigencia se comprometieron \$ 63.326.183.707, correspondiente al 96.29%.

### Pilar 1. Igualdad de calidad de vida.

#### Programa: Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia.

**Meta uno:** Adecuación de Jardines Infantiles durante el 2019, se realizó la adecuación del jardín Pebbles y Bam Bam con un mantenimiento general, cambio de cubiertas, pisos, pintura, adecuación de espacios y cocina.



**Meta dos:** Vinculación durante el 2019 de más de 200 personas en procesos de protección, prevención de maltrato y de todas las formas de trabajo infantil a través de acciones vinculantes de formación y de visibilización de los derechos de los niños y niñas de la localidad 5° de Usme.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

También se realizaron encuentros de padres, madres y cuidadores para la socialización de lineamientos y estrategias de intervención en contra de todos los tipos de violencia contra los menores, todo esto a través de las actividades descritas en el Contrato de prestación de servicios número 197 de 2019.



**Meta tres:** Dotación de jardines infantiles para la primera infancia en la Localidad de Usme, para la vigencia 2019 se dotaron 26 jardines de la Secretaría Distrital de Integración Social y 28 Asociaciones en las cuatro modalidades del ICBF con 438 Unidades operativas, atendiendo a 14.376 niños y niñas de la Localidad de Usme.



**Programa: Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente.**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**Meta uno:** Entrega de subsidios tipo C a personas mayores por anualidad.

Para la vigencia 2019 se ejecutó el 99.56% de lo proyectado, cumpliendo con el Pago de los apoyos económicos a personas mayores participantes.

Para la vigencia en mención se contó con 3107 participantes también se realizaron en los diferentes territorios de la localidad, encuentros de desarrollo humano para el fortalecimiento de la Política Pública Social de envejecimiento y vejez, a su vez se han realizado procesos de focalización y validación de condiciones de las personas mayores participantes con el fin de depurar lista de espera de solicitud de servicio y todo lo relacionado a seguimientos.



**Meta dos:** Beneficiar personas de la localidad en condición de discapacidad con ayudas técnicas No cubiertas por el POS.

En el 2019 se entregaron, 504 personas producto del convenio 285 de 2018 mediante el apoyo de ayudas técnicas de alta, media y baja complejidad que posibilitan la inclusión de la población en términos del cumplimiento de sus derechos fundamentales.

A continuación, se discriminan las ayudas técnicas entregadas por tipo; se aclara que aún estamos en proceso de subir a base información de últimas ayudas entregadas.

TIPO DE AYUDA
MOVILIDAD
PROTECCION
MOVILIARIO
KITS COGNITIVOS
KITS VISUALES
ZAPATOS PIE DIABETICO
MEDIAS
ORTESIS
TOTAL



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



**Programa: Inclusión educativa para la equidad.**

**Meta:** Dotar IED de la localidad con dotaciones pedagógicas de conformidad con sus necesidades técnicas.

Durante el 2019, se contrató el cubrimiento de 15 IED con ayudas tecnológicas y dotacionales (computadores, USB, maletas). Para el uso de los alumnos en sus actividades cotidianas de aprendizaje.

**Programa: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte.**

**Meta uno:** Apoyar Eventos Artísticos y Culturales en el Cuatrienio.

Durante el 2019 se contrataron 17 eventos artísticos y culturales en la localidad de Usme de los cuales se realizaron tres de ellos en los meses de octubre y diciembre de 2019, atendiendo a más de 20.000 niños y niñas de la localidad y 168 Juntas de Acción Comunal.

**Meta dos:** Realizar Eventos de Recreación y Deporte.

Durante el 2019 se contrataron 12 eventos de Recreación y Deporte en la localidad de Usme, de los cuales se realizaron los eventos de reconocimiento de los líderes comunales de la localidad durante el último trimestre de 2019.

**Meta tres:** Vincular Personas a Procesos de Formación Artística y Cultural en el Cuatrienio.

Durante el 2019 se realizó la vinculación de 600 personas en los distintos procesos de formación artísticos y culturales ofrecidos en la Localidad de Usme.

**Meta cuatro:** Vincular Personas a Procesos de Formación Deportiva, Recreativa y de Actividad Física.

Durante el 2019 se realizó la vinculación de 600 personas en los distintos procesos de formación Deportiva, Recreativa y de Actividad Física ofrecidos en la Localidad de Usme.





## **Pilar 2. Democracia urbana.**

### **Programa: Recuperación, Incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad.**

**Meta uno:** Apoyar demandas de Titulación Predial por medio de Acompañamiento. Dicha Meta se está cumpliendo en el 2019 a través del acompañamiento a las comunidades a través de 300 casos seleccionados luego de realizar los estudios técnicos y jurídicos pertinentes de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría Distrital de Hábitat (caja de vivienda popular).



### **Programa: Espacio público, derecho de todos.**

Durante la vigencia 2019 se continuó la construcción y mejoramiento de la mega obra de construcción del parque Mira valle, obra que será de vital importancia para los habitantes de la localidad de Usme, ya que servirá para el desarrollo de actividades sociales, físicas y saludables.

Además, se adelantó el mantenimiento de 15 parques ubicados en las diferentes UPZ de la Localidad, adelanto acciones en pro de los derechos básicos de los habitantes de la Localidad.



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**



También se adelantó la construcción y mantenimiento de aproximadamente 148 CIV en toda la localidad, garantizando con esto muchos derechos ciudadanos y de crecimiento social en todas las 7 UPZ de la localidad y también realizando la conexión entre las veredas que componen la ruralidad de la Localidad 5°.

- Se ha realizado la construcción de 10,84 Km/carril de malla vía local y rural. Y se ha contratado 19,24 Km/carril.
- Se realizó la construcción de placa huellas en las catorce veredas de Usme. Se realizó el mantenimiento a los anillos viales de las veredas el Destino, Uval, Unión, Andes, Hato, Margaritas y Requilina.
- Se realizó la construcción de micro pavimentó a las veredas Destino, Curubital, Arrayanes, Hato y Corinto.
- Se han entregado 3 Km/carril de malla vial local urbana, de 8,91 Km/carril contratado. Para lograr un 74,25%.
- Se realizó la construcción de vías urbanas en los diferentes barrios de la localidad de Usme, así mismo la construcción de espacio público y acciones de movilidad.
- Se han intervenido 32,31 Km/carril, realizando mantenimiento de vías urbanas en los diferentes barrios de la localidad de Usme, así mismo la construcción de espacio público y acciones de movilidad. Lo contratado ha sido 33,06 Km/carril.
- Se han intervenido 20,22 km/carril de malla vial rural.
- Y se ha contratado 55,69 km/carril.
- Se realizó la construcción de placa huellas en las catorce veredas de Usme.
- Se realizó el mantenimiento a los anillos viales de las veredas el Destino, Uval, Unión, Andes, Hato, Margaritas y Requilina.
- Se realizó la construcción de micro pavimentó a las veredas Destino, Curubital, Arrayanes, Hato y Corinto.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

- **25%** - Se ha intervenido 6000 m2 de espacio público de la localidad de Usme, que estaba completamente abandonada. Se ha contratado 18.823,96 m2.
- **75%** - A la fecha se ha contratado 2,14 m2 de espacio público, pendiente de su ejecución.

### **Pilar 3. Construcción de comunidad.**

#### **Programa: Seguridad y Convivencia para todos.**

**Meta uno:** Realizar Dotaciones de seguridad.

Durante la vigencia 2019 se fortalecieron las acciones de seguridad en la localidad de Usme a través de la adquisición de vehículos para el FDLU, los cuales serán utilizados por las diferentes autoridades competentes en pro del beneficio de la comunidad Local.



Por otra parte, esta localidad ha tenido un aumento en equipos de alta tecnología 233 cámaras de seguridad conectadas al C4 de la Policía Metropolitana, para realizar monitoreo a la localidad brindando una mejor seguridad especialmente en los puntos críticos identificados tanto por la comunidad como por el Sector de la Secretaría de Seguridad y la Policía

### **Eje transversal. Desarrollo económico basado en el conocimiento.**

**Programa: Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá región.**

**Meta:** Vincular personas en el proyecto estratégico eco turístico de conservación ambiental.

Durante El 2019 se contrató la vinculación de 600 personas en ejercicios de conservación ambiental y fomento del ecoturismo en la localidad de Usme, en donde se transversalizaron las realidades locales



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**



y se han ajustado hacia la creación y fortalecimiento de varios modelos turísticos locales en concordancia con las políticas públicas relacionadas con el sector.

También se fortalecerán más de 20 organizaciones a nivel local dedicadas al emprendimiento turístico con formación y de esas 20 la mitad fueron favorecidas con incentivos, para su tarea diaria de mostrar la localidad al mundo.

### **Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética.**

#### **Programa: Recuperación y manejo de la estructura ecológica principal.**

**Meta uno:** Sembrar árboles nativos en la localidad.

Durante el 2019 se realizó la contratación de la siembra de más de 1000 elementos arbóreos en diferentes puntos de la localidad cumpliendo con las disposiciones técnicas, ambientales y legales para tal fin, favoreciendo con esto el derecho a la vida de los habitantes y el retardo de las acciones del cambio climático.

**Meta dos:** Intervenir Hectáreas de espacio público con acciones de re-naturalización y/o eco urbanismo.

Durante el 2019 se contrató la erradicación de 1 hectárea de retamo espinoso, realizando la re-naturalización de dicho espacio con 1000 elementos arbóreos en localidad cumpliendo con las disposiciones técnicas, ambientales y legales para tal fin, preservando la flora y faunas de las especies invasoras que tanto han afectado la Localidad.

**Meta tres:** Intervención de espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo.

Durante el 2019 se contrató la intervención de 100 metros de espacio público en la localidad con acciones de jardinería en diferentes puntos, cumpliendo con las disposiciones técnicas, ambientales y legales para tal fin, logrando así el embellecimiento de ciertos sectores de la localidad en conjunto con las comunidades para su posterior disfrute y así garantizar el derecho a un ambiente libre de nocividad y compartir en familia.

#### **Programa: Desarrollo Rural Sostenible**

**Meta uno:** Beneficiar personas a través de emprendimientos rurales.

El componente de iniciativas productivas rurales, identifica propuestas productivas de los productores rurales de la localidad, se beneficiaron mediante procesos de formación a grupos de productores asociados y de estos se implementó en las vigencias 2018 y 2019.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Se han beneficiado a 270 personas La ejecución del contrato se realiza brindando la oportunidad a la comunidad rural participar activamente en todas las fases de la ejecución del proyecto, se presenta un gran interés por parte de la comunidad.

**Meta dos:** Beneficiar personas con acciones de asesoría técnica agropecuaria.

La Alcaldía Local de Usme a través del accionar de la ULATA en el tema de extensión agropecuaria, hace presencia permanente en el territorio rural y está a diario en contacto con la población beneficiaria, se posee un vasto conocimiento del territorio, sus habitantes, organizaciones sociales, casuística cotidiana, en la actualidad se posee un equipo de profesionales y técnicos contratados directamente por la Alcaldía Local.

<b>Asistencia técnica ULATA 2018</b>	
<b>Componente Pecuario</b>	
asistencias técnicas pecuarias	1062
<b>Componente Agrícola</b>	
asistencias técnicas agrícolas	377
huertas caseras mixtas implementadas	83
<b>Componente Comercial</b>	
asistencias técnicas comerciales	500
<b>Componente ambiental</b>	
asistencias técnicas ambientales	246
total de asistencias enero 1 a diciembre 31	2.185
<b>vivero la Requilina</b>	
producción material vegetal	15.000
entrega de material vegetal	9.345
<b>Población beneficiada</b>	<b>10.925</b>

Se han beneficiado a 27.790 personas, La modalidad de contratación de la Alcaldía para este proyecto, permite la prestación del servicio de extensión agropecuaria de manera eficaz, oportuna de manera permanente y continua además permite a la administración local un control sobre la ejecución y recursos del mismo.

**Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.**

**Programa: Gobernanza e influencia local, regional e internacional.**

**Meta uno:** Cubrir ediles con el pago de honorarios.

Con respecto a esta meta la Alcaldía Local de Usme cumplió a cabalidad con la totalidad de las mensualidades por concepto de honorarios de los ediles.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**Meta tres:** Implementación de la estrategia de IVC que permita mejorar los índices de eficiencia y eficacia de la Alcaldía.

Se ha realizado 1 Estrategia por vigencia (2017, 2018 y 2019). Mediante el Plan Anual de Adquisiciones se ha gestionado la contratación necesaria para garantizar la Inspección, vigilancia y control en materia de Espacio Público, Actividad Económica, Obras y Urbanismo, de tal forma que se garanticen los derechos de los ciudadanos y se haga cumplir la ley sobre dichos temas. Orientando por medio de sensibilizaciones a la ciudadanía.

**Meta cuatro:** Fortalecimiento de organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación.

Durante la vigencia 2019 se fortalecieron nuevamente veinte instancias de participación ciudadana de la localidad a través del apoyo en temas de formación en participación ciudadana y control social, también a su vez dichas organizaciones fueron objeto de desembolso de iniciativa de fortalecimiento.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.


## 5.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

La georreferenciación de las inversiones realizadas, inicialmente en malla vial, parques, dotación a jardines infantiles e instituciones educativas, salones comunales y escuelas de formación artística, contribuye al fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación de las intervenciones adelantadas por las alcaldías locales, al considerar una perspectiva que pone en contexto territorial los productos contratados y entregados a través de los FDL.

De igual manera permite ir construyendo una cultura que, en lo institucional, obliga a pensar la planeación de la inversión más allá de presupuestos, metas y cifras crudas y, en lo participativo, facilita la identificación de la localización de dichas inversiones, así como el control ciudadano sobre las mismas.



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

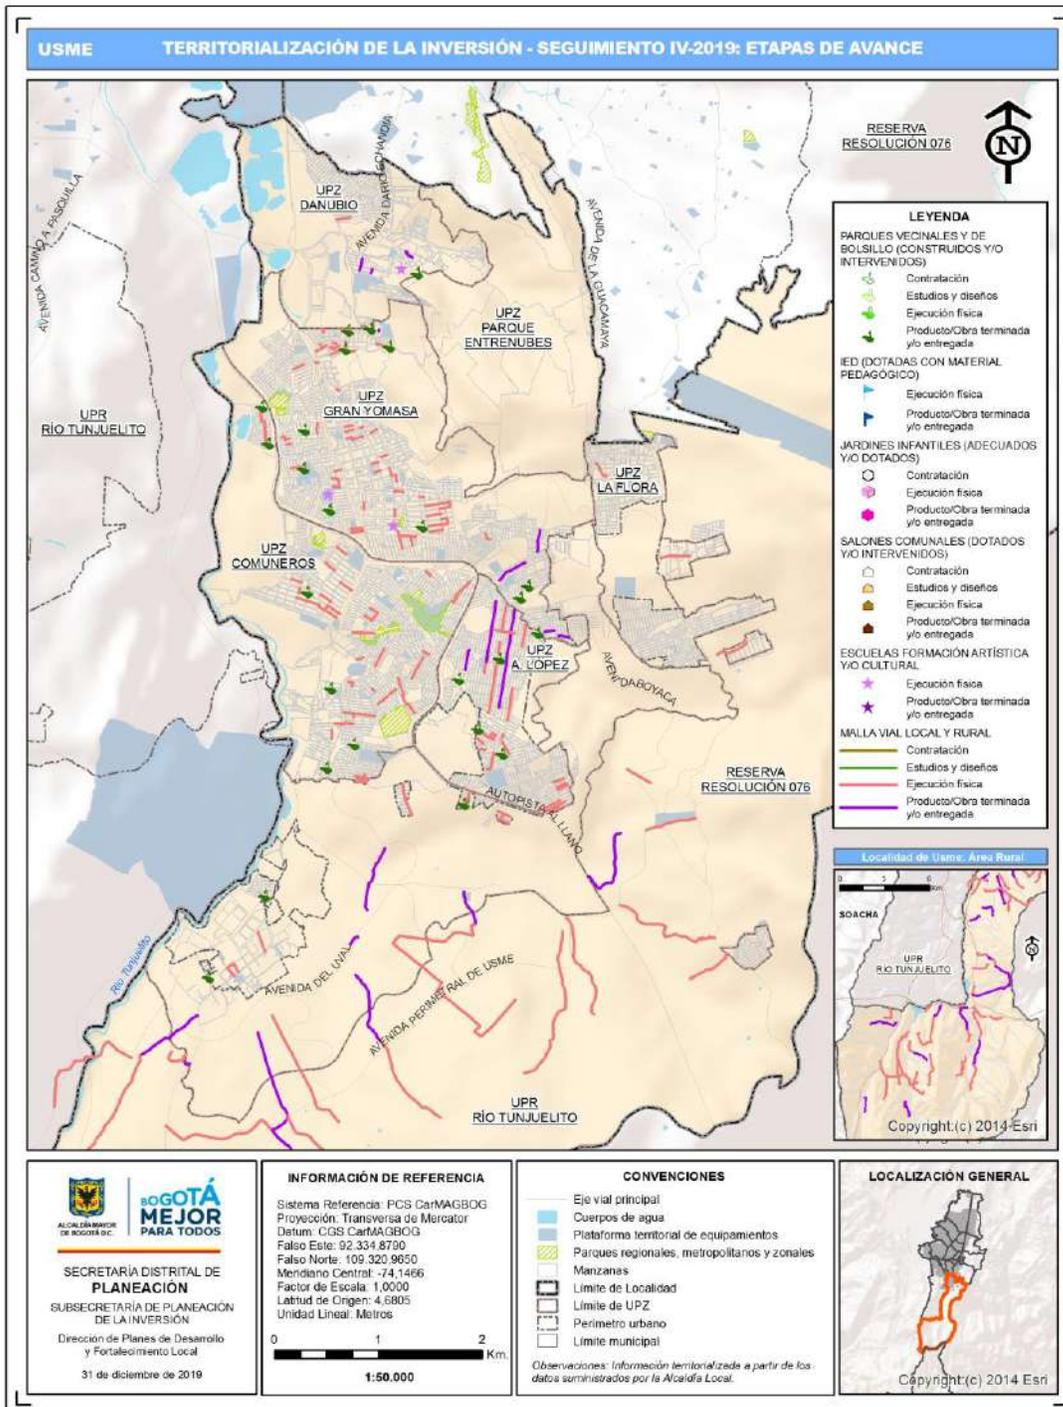

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



Tabla No. 11. Territorialización malla vial local.

Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5000327	DG 61 SUR entre TV 3B y TV 3D BIS	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5000385	DG 65 A SUR entre KR 4H y KR 65	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5000421	DG 65 A SUR entre KR 4G y KR 4H	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5000460	KR 7C BIS entre CLL 66 A SUR y ND	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5000484	KR 7C BIS entre CLL 66 SUR y CLL 6	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5000496	KR 7 entre CLL 66 SUR y CLL 66A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5000599	ANILLO VIAL	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5003041	KR 10 ESTE entre CLL 81A SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5003131	KR 10 ESTE entre CLL 81C SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5003234	KR 10 ESTE entre CLL 82 SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5003290	KR 10 ESTE entre CLL 84 SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5003506	CLL 87B SUR entre KR 7F ESTE y K	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5003524	CLL 87B SUR entre KR 7D BIS ESTE	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5003575	CLL 87B SUR entre KR 7D ESTE y K	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5003703	CLL 87B SUR entre KR 7ESTE y TV	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5004225	KR 5A ESTE entre CLL 88G SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5004313	KR 6F ESTE entre CLL 88F SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5004356	KR 5A ESTE entre CLL 88H SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5004536	KR 6F ESTE entre CLL 88G SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5004580	KR 5A ESTE entre CLL 89A SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5004699	KR 5A ESTE entre CLL 89 C SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5004744	CLL 89B SUR entre KR 9 ESTE y K	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5004760	CLL 89B SUR entre KR 8F ESTE y K	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5004780	CLL 89B SUR entre KR 8D BIS ESTE	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5004802	KR 6F ESTE entre CLL 89 SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5004817	KR 9A ESTE entre CLL 89B SUR y D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5004920	DG 89B BIS SUR entre KR 10 ESTE	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5004926	DG 89B BIS SUR entre KR 10 BIS E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5004930	DG 89B BIS SUR entre KR 10A ESTE	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5005028	KR 5A ESTE entre CLL 90 SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5005125	KR 6F ESTE entre CLL 89C SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5005284	DG 89B BIS SUR entre KR 10A BIS E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5005317	KR 2B ESTE entre CLL 90B SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5005322	KR 5A ESTE entre CLL 90 A SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5005401	KR 6F ESTE entre CLL 90 SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5005436	KR 5A ESTE entre CLL 90 B SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5005509	KR 2B ESTE entre CLL 90D SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5005584	KR 5A ESTE entre 90D SUR y CLL 9	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5005644	KR 6F ESTE entre CLL 90A SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5005714	KR 2B ESTE entre CLL 91 SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5005746	KR 5A ESTE entre CLL 91 SUR y C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5005779	KR 6F ESTE entre CLL 90D SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5005926	KR 6F ESTE entre CLL 91 SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5006116	KR 6F ESTE entre CLL 97B SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5006269	KR 6F ESTE entre CLL 97D SUR y C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5007864	DG 89B BIS SUR entre KR 9A ESTE	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5008385	CLL 87B SUR entre KR 7C ESTE y K	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5008401	ANILLO VIAL	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5008403	ANILLO VIAL	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5008417	ANILLO VIAL	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5008417	PLANTA TRAMO 2	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009577	VIA EL UVAL	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009577	VEREDA REQUILINA	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009577	VEREDA REQUILINA	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009726	UNION BAJO	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009584	VEREDA REQUILINA	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009760	EL HATO	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009584	VEREDA REQUILINA	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009642	ALTO LA MUÑECA	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009783	Piedras Gordas Tramo 2	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009787	Anillo vial	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009642	CORINTO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009721	VEREDA LA UNION	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009811	Anillo vial	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009812	Anillo vial	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009813	Anillo vial	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009825	OLARTE ENTRADA VIRGEN	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009721	VEREDA LA UNION	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009830	Tramo 2	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009834	EL ARCA	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009836	QUEBRADA	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009849	TRAMO 1	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009722	VEREDA LA UNION	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009875	Escuela el destino	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009722	VEREDA LA UNION	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009903	FINCA ARDILA	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009917	MARGARITAS	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009728	VEREDA LA UNION	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009949	MARGARITAS	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009950	MARGARITAS	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Eta pa avance
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5001250	CRA. 14 X ENTRE CLL 71 F SUR Y C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5001271	CRA. 14 X ENTRE CLL 71 F BIS SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5001300	CRA. 14 X ENTRE CLL 71 C BIS SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5001321	CRA. 14 X ENTRE CLL 72 SUR Y CLL	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5001356	CRA. 14 X ENTRE CLL 72 BIS SUR Y	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5001384	CRA. 14 W ENTRE CLL 72 A BIS SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5001407	CRA. 14 W ENTRE CLL 72 B SUR Y	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5001438	CRA. 14 W ENTRE CLL 72 C SUR Y	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5001459	CRA. 14 W ENTRE CLL 73 SUR Y CL	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5001501	CRA. 14 W ENTRE CLL 73 BIS SUR Y	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5001543	CRA. 14 W ENTRE CLL 73 SUR Y CL	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5001569	CRA. 14 W ENTRE CLL 73 A BIS SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5001582	CLL 73D SUR ENTRE KR 11 Y KR 11	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5001616	CRA. 14 W ENTRE CLL 73 B SUR Y	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5001639	CRA. 14 W ENTRE CLL 73 B BIS SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5002272	CLL 76 SUR ENTRE CLL 76 SUR Y K	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5003360	CLL 81 BIS SUR ENTRE KR 17 ESTE	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5003366	CLL 81 BIS SUR ENTRE KR 18 ESTE	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5003369	CLL 81 BIS SUR ENTRE KR 16 ESTE	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5003403	CLL 81 BIS SUR ENTRE KR 15 ESTE	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5003409	CLL 81 BIS SUR ENTRE KR 19 ESTE	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5005089	CLL 92 SUR ENTRE ENTRE KR 22 E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5005156	CLL 92 SUR ENTRE ENTRE KR 21 A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5005221	CLL 92 SUR ENTRE ENTRE KR 21 E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5005292	CLL 92 SUR ENTRE ENTRE KR 20 A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5005293	CLL 92 SUR ENTRE ENTRE KR 20 E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5006552	DG 100 SUR ENTRE KR 6 ESTE Y D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5006603	DG 100 SUR ENTRE DG 100A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5006625	DG 100 SUR ENTRE KR 6F ESTE Y K	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5007160	KR 1 ESTE ENTRE CLL 117 SUR Y C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5007187	KR 1 ESTE ENTRE CLL 117A SUR Y	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5007204	KR 1 ESTE ENTRE CLL 117B SUR Y	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5007226	KR 1 ESTE ENTRE CLL 117C SUR Y	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5007261	KR 1 ESTE ENTRE CLL 117D SUR Y	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5007276	KR 1 ESTE ENTRE CLL 117F SUR Y	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5007299	KR 1 ESTE ENTRE CLL 117G SUR Y	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5007316	KR 1 ESTE ENTRE CLL 118 SUR Y C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5007331	KR 1 ESTE ENTRE CLL 118 BIS SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5007341	KR 1 ESTE ENTRE CLL 118 A SUR Y	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5008225	CLL 92 SUR ENTRE ENTRE KR 15 E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5008366	CLL 73D SUR ENTRE KR 11 Y KR 12	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009728	VEREDA LA UNION	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009736	VEREDA LA UNION	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009736	VEREDA LA UNION	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009740	TRAMO ESCUELA	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009740	VEREDA ANDES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009734	VEREDA LA UNION	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009735	VEREDA ANDES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009771	CANCHA	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009738	VEREDA ANDES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009771	VEREDA ARRAYANES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009762	VEREDA EL HATO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009763	VEREDA EL HATO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009772	FINCA VANEGAS	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009782	VEREDA ARRAYANES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009772	ARRAYANES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009789	Tramo 1	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009789	CURUBITAL	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009790	VEREDA CURUBITAL	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009856	VEREDA CORINTO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009874	VEREDA EL DESTINO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009790	CURUBITAL	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009892	VEREDA ANDES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009911	VEREDA EL HATO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009806	VEREDA EL DESTINO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009806	DESTINO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009929	VEREDA LA UNION	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009810	Anillo vial	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009946	VEREDA ANDES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009958	VEREDA EL HATO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009978	VEREDA SOCHES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009997	VEREDA CHIGUAZA	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	19014626	CHIGUAZA	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	30001907	DIAGONAL 83 B SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	30001908	DIAGONAL 83 B SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50000679	DIAGONAL 99 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50000680	CARRERA 2	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50005210	CARRERA 2 B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50005211	DIAGONAL 87 D SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50005250	CARRERA 1 D	Local	Ejecución física





Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5006666	DIAGONAL 100 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5006706	DIAGONAL 100 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5006742	CALLE 101 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5006752	CALLE 101 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5006771	DIAGONAL 100 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5006803	CARRERA 7 H ESTE	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5006848	CARRERA 7 BIS A ESTE	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5006955	CARRERA 7 BIS A ESTE	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5006956	CALLE 105 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007045	CALLE 116 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007050	CALLE 116 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007057	CARRERA 3B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007058	CALLE 116 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007065	CALLE 116 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007098	CARRERA 4 A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007110	CARRERA 4	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007119	CARRERA 3B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007256	CARRERA 6 D BIS ESTE	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007293	CARRERA 6 D BIS ESTE	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007336	CALLE 116 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007344	TRANSVERSAL 7 B ESTE	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007346	CALLE 116 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007350	TRANSVERSAL 7 B ESTE	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007351	CALLE 117 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007356	CALLE 117 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007624	CARRERA 14 A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007641	CALLE 137 B SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007650	CALLE 137 C SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007797	CARRERA 9 B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5008273	CARRERA 6 B ESTE	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5008412	CHIGUAZA	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009552	CARRERA 6 D BIS ESTE	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009575	SOCHES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009810	DESTINO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009588	CORINTO:	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009827	Tramo 3	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009827	CORINTO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009831	VEREDA CHIGUAZA	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009727	UNIÓN	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009831	VEREDA CHIGUAZA	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009729	ANDES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009852	VEREDA SOCHES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009737	UNIÓN	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009739	UNIÓN	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009741	UNIÓN	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009742	UNIÓN	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009749	MARGARITAS	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009758	HATO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009759	HATO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009770	ARRAYANES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009852	VEREDA SOCHES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009773	ARRAYANES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009774	ARRAYANES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009780	ARRAYANES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009785	CURUBITAL	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009786	CURUBITAL	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009859	OLARTE ESCUELA	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009859	OLARTE ESCUELA	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009791	CURUBITAL	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009792	CURUBITAL	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009793	CURUBITAL	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009795	DESTINO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009889	VEREDA SOCHES	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009889	VEREDA SOCHES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009814	DESTINO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	5009922	CANCHA	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009828	CORINTO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009829	CORINTO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009922	VEREDA ARRAYANES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009837	REQUILINA	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009838	REQUILINA	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009839	UVAL	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009842	UVAL	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009843	UVAL	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009845	UVAL	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009927	VEREDA LA UNION	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009854	SOCHES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009927	ANDES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009871	SOCHES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009919	DESTINO	Rural	Ejecución física





Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009921	ARRAYANES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	5009937	VEREDA EL DESTINO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009930	ANDES	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009934	CORINTO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009937	VEREDA EL DESTINO	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009944	REQUILINA	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009947	MARGARITAS	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009968	UNIÓN	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009986	UVAL	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5010000	CHIGUAZA	Rural	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5000810	CL 69 D BIS SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5000804	CL 69 D BIS SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5000797	CL 69 D BIS SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5008306	CL 69 D BIS SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5000777	CL 69 D BIS SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5010428	CL 69 D BIS SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5005410	CL 91 C SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5005372	CL 91 C SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002793	KR 4	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007145	KR 10 ESTE	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007163	CL 111 SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007182	CL 111 A SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007329	CL 114 A SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007328	CL 114 SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007297	CL 114 SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007281	CL 114 SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007339	CL 113 SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007326	CL 113 SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007279	CL 113 SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007108	CL 109 SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	30001879	KR 10 ESTE	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	30001874	KR 10 ESTE	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5000762	KR 12	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5008303	KR 9 A BIS	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5000786	CL 69 F SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5000783	CL 69 F SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5000609	KR 9 A	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5000601	KR 11	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5000738	KR 9	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5000612	KR 8 C	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5001572	CL 73 A BIS SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5001608	CL 73 B SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5001666	CL 73 B BIS SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5001525	KR 14 A	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5005541	KR 6 B	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5005506	KR 6 B	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5010221	KR 9	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5006595	KR 9	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5006618	KR 9	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009619	CL 136 A SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007550	CL 136 A SUR	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5006467	CL 108 S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5006475	CL 108 S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007886	KR 14G	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5003753	CL 94BIS S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5004105	CL 95A S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002004	CL 74BBIS S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5001989	CL 74BBIS S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5004426	KR 8	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5004280	CL 95A S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5003903	CL 93 S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5004422	CL 95A S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5004279	KR 14A	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5004506	CL 94 S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5004505	KR 8	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5004169	CL 95A S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5004110	CL 94A S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5004363	CL 95 S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002565	KR 11	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5003315	CL 91BIS S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002956	CL 81BIS S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5003568	CL 92B S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002895	CL 81 S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5001957	CL 75 S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002138	CL 75A S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002205	KR 14BIS	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5001871	CL 74D S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002054	CL 75 S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002064	CL 75A S	local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5001604	CL 73DBIS S	local	Ejecución física



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002710 CL 79 S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002529 CL 76C S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5003035 CL 81BIS S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002416 CL 76A S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5003048 CL 81BIS S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002349 NE		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002551 KR 3A		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002172 KR 8C		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002343 CL 76 S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5003025 KR 8CBIS		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5003177 KR 8B		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002941 CL 80A S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002656 CL 78 S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002559 CL 77BIS S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002844 CL 80 S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002562 CL 77BIS S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002666 KR 8D		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5003043 CL 81BIS S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5003246 KR 8CBIS		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5003034 CL 81BIS S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002798 CL 80 S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002503 CL 76C S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002509 CL 76C S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5002105 KR 8D		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5000920 CL 69DBIS S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5001513 CL 73DBIS S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5001417 KR 11		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5007846 CL 73A S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5001463 CL 73BBISA S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5001473 CL 73DBIS S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5001441 CL 73BBISA S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5001120 TV 10BIS		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5001423 CL 73A S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5001478 CL 73BBISA S		local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	5009214 CL 69F S		local	Ejecución física

Fuente: Visor territorialización MUSI

Tabla No. 12. Territorialización parques.

Código proyecto	Vigencia	Nombre parque	Dirección	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017 <Null>		KR 1B BIS A ESTE 68A 11 SUR CL 68A SUR CON TV 1C ESTE, CO	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017 <Null>		CL 117 SUR ENTRE KR 6D ESTE Y KR 6D BIS ESTE, COSTADO N	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017 <Null>		ENTRE KR 3A BIS (49 ESTE) Y KR 3D (48B ESTE) CON CL 133A	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017 <Null>		CL 138B SUR ENTRE KR 3 BIS A Y KR 3A BIS, COSTADO ORIENT	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017 <Null>		ENTRE CL 102A SUR Y CL 103 SUR Y ENTRE KR 1A ESTE Y TV 1	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2018 <Null>		CUADRANTE KR 2C ESTE Y DG 97C BIS SUR ENTRE CL 97B SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017 <Null>		KR 1B BIS A ESTE 68A 11 SUR CL 68A SUR CON TV 1C ESTE, CO	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017 <Null>		KR 1F BIS B F CON CL 68A SUR COSTADO SUR ORIENTAL DG 6	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017 <Null>		KR 33 A ESTE CON CL 90A SUR COSTADO SURORIENTAL KR 34	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017 <Null>		KR 2º ESTE 80 10 SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017 <Null>		KR 2º ESTE 80 10 SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017 <Null>		CL 68B SUR 7B 20 ESTE	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017 <Null>		ENTRE KR 8 BIS ESTE Y KR 8 ESTE Y ENTRE DG 84C SUR Y DG 8	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017 <Null>		POLÍGO FORMADO ENTRE LA KR 7B ESTE, KR 7D ESTE Y LA CL	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017 <Null>		CUADRANTE KR9 ENTRE CL 115A SUR Y CL 115 SUR.	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019 <Null>		URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019 <Null>		KR 2A ESTE NO. 65F 06 SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019 <Null>		ENTRE DIAGONAL 68C SUR (CARRERA 27A ESTE) Y CALLE 69A	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019 <Null>		INTERIOR DE LA MANZANA 16, COMPREDIDA ENTRE LA CALL	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019 <Null>		CL 72D BIS SUR CON KR 5A, COSTADO SUR-ORIENTAL	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019 <Null>		CL 71A SUR ENTRE KR 5 Y KR 7	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019 <Null>		DG 98 SUR 5I 01 ESTE	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019 <Null>		CALLE 93 SUR NO. 6B 12 ESTE	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019 <Null>		ENTRE CALLE 111 SUR Y CALLE 111A SUR Y ENTRE TRANSVERS	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019 <Null>		ENTRE CALLE 94A SUR Y CALLE 95 SUR CON CARRERA 2 (TRAN	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

## 6. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS

### **Pilar 1. Igualdad de calidad de vida.**

Programa: Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia.

Programa: Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente.

Programa: Inclusión educativa para la equidad.

Programa: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte.

Durante la vigencia 2019 no se reportaron mayores contratiempos con respecto del cumplimiento de las metas plan de desarrollo proyectadas para la vigencia; sin embargo, los profesionales y analistas que realizan las visitas a diario a los cientos de miles de hogares en la localidad reportan la necesidad del incremento responsable de los recursos asignados a este tipo de población vulnerable.

Con respecto a la adecuación de jardines infantiles también se evidenció la falta de recursos para lograr más jardines infantiles, al igual que en vigencias anteriores.

Con respecto a las dotaciones escolares no se generó ningún tipo de percance correspondiente a especificaciones técnicas y esta meta está cumpliendo más que a satisfacción.

De acuerdo a las metas correspondientes a formación y generación de eventos de carácter deportivo y cultural, falta empoderamiento de las organizaciones comunales frente a la participación activa en los proyectos culturales y deportivos, a su vez se necesita más recurso para abarcar y beneficiar a más personas en la localidad.

### **Pilar 2. Democracia urbana.**

En cuanto al cumplimiento de metas en lo correspondiente a los programas de Recuperación, Incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad y Espacio público, derecho de todos no se han presentado inconvenientes en el retraso del cumplimiento de metas pactadas; sin embargo, el equipo de profesionales ha detectado la necesidad del incremento de presupuesto asignado a la construcción y mantenimiento de la malla vial local, ya que dichos rubros son muy sensibles y además son de vital importancia para la comunidad en todos sus sectores.

### **Pilar 3. Construcción de comunidad.**

Programa: Seguridad y Convivencia para todos.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Las soluciones frente a las problemáticas de seguridad y convivencia, son insuficientes para las diversas formas de inseguridad que aquejan a la Localidad, asociadas a las dificultades de convivencia por las diferencias socioeconómicas y culturales que hacen presencia, la ampliación de presupuesto permitiría una mayor cobertura y sostenibilidad de las acciones para atender las diferentes problemáticas.

Falta de articulación conceptual con las diferentes entidades que conforman el sector, toda vez que debido a fallos en la comunicación acertiva y unificación de criterios organizacionales, las organizaciones de base y los habitantes de la localidad se ven afectados dentro del desarrollo de sus actividades.

### **Eje transversal. Desarrollo económico basado en el conocimiento.**

Programa: Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá región.

Para el presente pilar y programa no se han generado contratiempos ni retrasos en la ejecución de las metas propuestas a través del Plan de Desarrollo Local, pero a pesar de esto se necesita más apoyo por parte de las entidades del orden Nacional y Departamental, toda vez que los esfuerzos se están centralizando en el sector Distrital, para lograr de Usme en vitrina con un portafolio amplio de servicios a la comunidad Nacional e Internacional.

### **Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética.**

Programa: Recuperación y manejo de la estructura ecológica principal.

Con respecto a este eje transversal y el desarrollo de sus dos programas encontramos la principal dificultad en la meta renaturalización y recuperación de la estructura ecológica principal, toda vez que los recursos y el tiempo asignados a la erradicación del retamo espinoso son insuficientes en comparación con las miles de hectáreas que se encuentran apostadas en nuestra Localidad.

Programa: Desarrollo Rural Sostenible.

Para el presente programa no se presentan retrasos frente al incumplimiento en el logro de las respectivas metas asociadas.

### **Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.**

Para esta meta se definieron una serie de acciones las cuales si bien, no han tenido contratiempos en su respectivo cumplimiento, si se ha denotado un gran esfuerzo por parte de la administración en la articulación de los diferentes actores para la realización de los efectos multiplicadores de las políticas públicas de participación.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## 7. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2019

Ver Anexo No 1.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.
